

Итоговый содержательный отчет по проекту
" Распространение опыта и результатов природоохранных
общественных организаций Кемеровской области в сети Интернет "
(с 01/10/99 по 01/07/2000г.г.)

Наименование проекта:	" Распространение опыта и результатов природоохранных общественных организаций Кемеровской области в сети Интернет"
Соглашение №:	Соглашение № 191GR4/ISC-99
Отчетный период:	октябрь 1999 - июль 2000 года
Организация - получатель гранта:	Региональная общественная организация "Информационное Экологическое Агентство" (ИнЭКА)
Руководитель проекта:	Безденежных Ольга Викторовна
Телефон:	(3843) 45-95-93, 45-83-45
Факс:	(3843) 45-95-93
Почтовый адрес:	Россия, 654080, ул. Свердлова 20, офис 42
Адрес электронной почты:	<u>nkzweb@nvkz.kuzbass.net</u>
Дата написания отчета:	20.08.2000г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА	4
ЧТО СДЕЛАНО	5
ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИХ ОПИСАНИЕ	5
КОММЕНТАРИИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	9
ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ДИЗАЙН, НАПОЛНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЕРВЕРА КУЗБАССА	9
КОНТАКТЫ	10
ЭКО-АТЛАС	10
ГОСТЕВАЯ КНИГА	10
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ САЙТА	10
ВЫВОДЫ:	11
СТАТИСТИКА ПОСЕЩЕНИЙ.....	11
РЕЗЮМЕ:	12
ТРУДНОСТИ ПРОЕКТА.....	13
УСПЕХИ ПРОЕКТА	13
КОММЕНТАРИИ:	14

ВВЕДЕНИЕ

При написании заявки на грант в фонд "Институт Открытое общество", ключевой целью проекта ставилось распространение опыта и результатов природоохранных общественных организаций Кемеровской области в сети Интернет.

В проекте ставились следующие задачи:

1. Создать специализированный экологический сервер в сети Интернет, с целью содействия тиражированию опыта и результатов (в том числе и ППТ) природоохранных общественных организаций Кемеровской области. Тем самым, содействуя передачи опыта и результатов между российскими организациями. На сервере предусматривалось размещение информации по успешным проектам, базирующимся на опыте и результатах ППТ и других экологических проектов. Проект рассчитан на долгосрочное сотрудничество с организациями Кемеровской области. Разработка областного экологического сервера должна являться первой ступенью к созданию регионального сервера, объединяющего правительственные, коммерческие, промышленные, образовательные и общественные организации имеющие собственные разработки и опыт реализации проектов в области охраны окружающей среды и здоровья населения. Что в свою очередь должно послужить наглядным примером для создания общероссийской системы, направленной на решение экологических проблем и привлечение общественности к участию в природоохранной деятельности.
2. Привлечь в работу по проекту, помимо общественных организаций, занимающихся природоохранной деятельностью, - коммерческие, правительственные и промышленные организации, работающие в области защиты окружающей среды, экологического просвещения и здравоохранения.
3. Поддержка задачи РОЛЛ по «расширению роли общественных организаций в решении экологических проблем». Ставилась цель вовлечь в деятельность по проекту организации, с которыми пока нет партнерских отношений, при условии создания для их проектов разделов на будущем сервере.
4. Создание в рамках экологического сервера персональных страниц для природоохранных организаций Кемеровской области. Включающих материалы об организациях, связанных с руководством, стратегическим планированием, юридическими аспектами деятельности, с размещением подробной информации об истории организаций, их партнерах, сотрудниках, направлениях деятельности.
5. Предоставить природоохранным организациям Кемеровской области возможности размещения на своих будущих страницах новостей, по мероприятиям, намеченным в их плане работы на 1999-2000г.
6. Содействовать развитию сотрудничества между природоохранными общественными организациями России и США. Всю информацию, размещенную на сервере, предполагалось перевести на Английский язык, в том числе и персональные страницы природоохранных организаций. Что послужит действенным партнерством на основе российского и американского опыта, знаний и результатов.

Сама реализация проекта стимулирует более тесное сотрудничество, передачу опыта и результатов между правительственными, промышленными, образовательными и общественными организациями, заинтересованными в решении экологических проблем и экологическом просвещении.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

В течение проекта было запланировано провести следующие мероприятия:

- Приобрести оборудование и материалы, необходимые для реализации проекта.
- Создать специализированный экологический сервер и разместить его в сети Интернет.
- Достичь договоренности с провайдером услуг интернет НТТС по размещению сайта и на бесплатное его обслуживание.
- Собрать максимально полную информацию по проекту ППТ «Контроль за многофакторными источниками загрязнения» (г. Новокузнецк) и разместить ее в разделе “ПРОЕКТЫ” на создаваемом Экологическом Сервере Кузбасса.
- Собрать информацию по природоохранным организациям городов Кемеровской обл., и создать для каждой из них специализированные интернет-страницы, включающих материалы об организациях, связанных с руководством, стратегическим планированием, юридическими аспектами деятельности, с размещением подробной информации об истории организаций, их партнерах, сотрудниках, направлениях деятельности.
- Провести необходимые фотоработы для наиболее красочного и полного предоставления размещаемой на сервере информации по организациям и их проектам.
- Всю полученную информацию по организациям и их проектам, откорректировать, перевести в электронный вид и занести на создаваемый Экологический Сервер Кузбасса в соответствующие тематические разделы.
- Всю информацию, размещенную на сервере перевести на английский язык, в том числе и персональные страницы природоохранных организаций. В целях содействовать развитию сотрудничества между природоохранными общественными организациями в России и США.
- Для ознакомления с целями и задачами проекта подготовить материалы для СМИ и поисковых систем Интернета, а так же создать и выпустить буклеты отражающих полное содержание выполняемого проекта.
- На основании поквартального плана работ провести рассылку созданных рекламных материалов по организациям Кемеровской обл.

ЧТО СДЕЛАНО

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИХ ОПИСАНИЕ

№	Наименование деятельности	Описание
1.	Приобретение необходимого оборудования и материалов в г. Новокузнецке	Приобретено оборудование и материалы согласно смете проекта.
3.	Открытие проекта «Распространение опыта и результатов природоохранных общественных организаций Кемеровской области в сети Интернет»	Объявлено в сети Интернет и по экологическим организациям Кузбасса о целях и задачах проекта «Распространение опыта и результатов природоохранных общественных организаций Кемеровской области в сети Интернет»
4.	Заключение договоров с участниками и исполнителями проекта	Были заключены договора с участниками и исполнителями проекта.
5.	Договоренность о размещении Экологического сервера Кузбасса (ЭСК) у провайдера Интернет услуг НТТС.	Проведен поиск наиболее приемлемого сервера для размещения ЭСК (Экологический сервер Кузбасса) в сети Интернет, из 5 серверов был выбран сервер провайдера Интернет услуг НТТС. Была достигнута договоренность о безвозмездном размещении неограниченного объема информации на сервере на неограниченный период времени.
6.	Дизайн, программирование, оформление сервера	Разработка дизайна сервера, программирование и проработка структуры были выполнены в полном объеме. На протяжении следующих шести месяцев происходило информационное наполнение сервера. <i>(см. в электронном виде в Интернете www.nvkz.kuzbass.net/ecology/).</i>
10.	Сбор информации по природоохранным общественным организациям г. Новокузнецка	За первые полтора месяца работы, была собрана полная информация по 6 НКО г. Новокузнецка. Также, помимо запланированных работ по сбору информации от 6 НКО, была собрана информация об одной инициативной группе (незарегистрированное НКО) и трех бюджетных организациях, которые ведут свою деятельность в области охраны окружающей среды. Организации с большим энтузиазмом и желанием помогали нам при сборе информации, исключение составила лишь одна организация, руководитель которой категорически отказался от сотрудничества, по необъясненным нам причинам.

11.	Сбор информации по ПППиТ «Контроль за многофакторными источниками загрязнения» (г. Новокузнецк)	<p>По Проекту ПППиТ (г. Новокузнецк) работы были выполнены в полной мере и даже в более большем объеме, чем планировалось.</p> <p>В ходе сбора информации возникали следующие трудности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - По некоторым проектам не сохранилось полной русскоязычной информации у новокузнецких исполнителей проекта - Некоторые исполнители проектов, перестали работать в организациях-исполнителях <p>Но, несмотря на них, сбор информации удалось успешно завершить.</p>
12.	Проведение фоторабот, сканирование фотографий, сортировка, занесение информации в компьютер	<p>Для наиболее полного и красочного предоставления информации на ЭСК, мы провели необходимые фотоработы, а также собрали имеющиеся у некоторых организаций фотографии для последующего их перевода в электронный вид. В ходе выполнения этих мероприятий, выяснилось, что большинство организаций совершенно не имеют фотографий по своей деятельности и фотографий сотрудников, в следствии чего фотоработы проводились на протяжении 1,5 месяца сбора информации, вместо 15 запланированных дней. Но это не создало каких-либо затруднений в выполнении других намеченных работ. С результатами фоторабот вы можете ознакомиться на Экологическом Сервере Кузбасса (www.nvkz.kuzbass.net/ecology/)</p> <p>По окончанию сбора материалов, была произведена полная сортировка полученной от организаций информации и сделанных фотографий, после чего была произведена интересующая нас выборка с последующим преобразованием в электронный вид.</p>
13	Формирование персональных WWW-страниц организаций г. Новокузнецка	<p>Для каждой новокузнецкой организации, которая пожелала разместиться на Экологическом Сервере Кузбасса, были созданы персональные WWW-страницы, отражающие историю, деятельность, достижения, информацию о руководстве и персонале, проектам и контактной информации.</p> <p><i>(См. в электронном виде в Интернете www.nvkz.kuzbass.net/ecology/organizations.htm).</i></p>
14	Формирование WWW-страниц в Интернете по ПППиТ	<p>По мере перевода получаемой информации в электронный вид, проводилась работа по формированию WWW-страниц по ПППиТ на Экологическом сервере Кузбасса (ЭСК) в Интернете. За один месяц работ вся информация, которая была подготовлена по ПППиТ, была представлена на ЭСК в виде отдельных WWW-страниц по каждому из проектов, объединенных в один раздел сервера <i>(См. в электронном виде в Интернете www.nvkz.kuzbass.net/ecology/p-ppit.htm).</i></p>

15	Подготовка материалов для СМИ	Для освещения проделанной работы среди широкого круга читателей и более подробного их ознакомления с целями и результатами работы, в ЭКО бюллетене (№1 за 2000) была размещена статья об Экологическом Сервере Кузбасса, рассказывающая о целях, задачах, достигнутых и предполагаемых результатах проекта.
16	Сбор информации по проектам и организациям г. Междуреченска	Благодаря тесному сотрудничеству РОО «ИнЭкА» с организациями г. Междуреченска, в ходе проведенных работ, была собрана информация по 3 НКО г. Междуреченска, включая расширенную информацию по проводимым ими проектам. Организации с большим энтузиазмом и желанием помогли нам при сборе информации.
17	Сортировка, редактирование, занесение информации в компьютер по материалам организаций г. Междуреченска. Формирование WWW-страниц.	<p>По окончанию сбора материалов, была произведена полная сортировка полученной от организаций информации и сделанных фотографий, после чего была произведена интересующая нас выборка и далее вся графическая и текстовая информация была преобразована в электронный вид.</p> <p>Для каждой междуреченской организации, которая пожелала разместиться на Экологическом Сервере Кузбасса, были созданы персональные WWW-страницы, отражающие историю, деятельность, достижения, информацию о руководстве и персонале, проектам и контактной информации. <i>(См. в электронном виде в Интернете www.nvkz.kuzbass.net/ecology/organizations.htm).</i></p>
18	Сбор информации по не ППиТ проектам (г. Новокузнецк) и ее размещение в сети Интернет.	За месяц работы по сбору информации по не ППиТ проектам, проводимых организациями г. Новокузнецка, была собрана информация обо всех значимых (по мнению руководителей организаций) проектах. Всего на момент окончания проекта собрана информация о 42 успешных проектах. После перевода информации в электронный вид, информация была размещена в сети Интернет на WWW-страницах организаций.
19	Открытие Экологического Сервера Кузбасса для посетителей	С Апреля 2000, ЭСК открыт для посещения без каких-либо ограничений. На этот момент еще осталось завершить работу над несколькими разделами, а так же пополнить разделы информацией от других организаций Кемеровской области, которая еще была не собрана на момент открытия сервера.
20	Создание клиентской базы ЭСК	<p>На сервере в разделе КОНТАКТЫ создана и постоянно пополняется база данных по организациям Кемеровской обл., участвующим в решении экологических проблем. Этот раздел не был изначально запланирован в структуре сервера, до подачи заявки, но ввиду его необходимости, было принято решение о его создании и поддержке.</p> <p>На момент итогового оформления раздела</p>

		«КОНТАКТЫ» были получены запросы из Областного комитета охраны окружающей среды и нескольких других новокузнецких организаций на получение информации. Им была предоставлена распечатанная и электронная версия базы данных. На текущий момент можно с уверенностью сказать, что это наиболее полная база данных по работающим природоохранным организациям Кемеровской области.
21	Проверка контактной информации по организациям на достоверность	Было проведено незапланированное по гранту тестирование всех телефонов, факсов и e-mail адресов, организаций которые были дополнены в базу данных КОНТАКТЫ, с целью не допустить размещение устаревшей контактной информации.
22	Редактирование, сортировка, занесение информации в компьютер по природоохранным организациям из других городов Кемеровской области	От организаций из городов Осинники, Таштагол была получена, обработана и переведена в электронный вид информация описывающая деятельность, достижения, проекты, и другие моменты, которой достаточно для формирования Интернет-страниц на сервере ЭСК. Для каждой из организации предоставившей о себе информацию, были созданы персональные WWW-страницы, отражающие историю, деятельность, достижения, информацию о руководстве и персонале, проектам и контактной информации.
23	Перевод материалов сервера на английский язык	Несмотря на рост курса доллара и увеличение расценок на перевод текстов, удалось в полной мере осуществить профессиональный перевод материалов сервера на английский язык. Общий объем текстовой информации (только на русском языке) размещенной на сервере составил 300.000 символов. (См. материалы в электронном виде по адресу www.nvkz.kuzbass.net/ecology/ <i>выберите English Version</i>)
24	Размещение Экологического атласа Кемеровской области в сети Интернет.	Используя печатный вариант Экологического атласа Кемеровской области, было проведено сканирование на профессиональном сканере, и дальнейшее ретуширование полученного изображения. Далее была произведена адаптация изображения для Интернета и создан раздел «ЭКО-атлас» на сервере ЭСК, куда оно было размещено.
25	Подключение «Гостевой книги» (GuestBook) к серверу.	Используя сервис сайта www.guestbook.ru на нашем сервере была создана гостевая книга, в которой посетители сервера могли бы оставлять свои пожелания, комментарии, вопросы для администрации.
26	Подключение московской службы рекламы «InterReklama.RU» к серверу ЭСК	С целью обеспечить долговременную рекламу (а не разовую, за счет привлечения дополнительных средств) было принято решение сделать ЭСК участником службы обмена баннерами www.ir.ru . На каждой странице сервера в самом низу размещен специальный программный код, благодаря которому мы производим обмен баннерами с другими серверами. Во время обмена мы показываем, чужой баннер, и одновременно наш баннер показывается на других серверах Интернета. Благодаря этому, ЭСК постоянно рекламируется в русско- и англо-

		язычной части Интернета.
27	Регистрация ЭСК в мировых и российских поисковых системах и каталогах.	Для привлечения посетителей на ЭСК, были поданы заявки в российские и зарубежные поисковые системы и каталоги. Рассмотрение заявок производится в течении 3-12 недель, поэтому о конкретных результатах можно будет сказать только уже после окончания официальных сроков проекта.
28	Оформление итоговой версии ЭСК и его английского варианта	В ходе 7 месяцев постоянной работы по сбору информации об организациях, проектах и целого ряда другой экологической информации, вся она была отсортирована, обработана и переведена в электронный вид и далее сформирована на Интернет-страницах Экологического Сервера Кузбасса. На данный момент ЭСК полностью готов к работе, включая в себя: 7 разделов, большое кол-во подразделов, 18 Интернет-страниц природоохранных организаций Кем. обл. и множество другой информации. Посетить сервер вы можете по адресу www.nvkz.kuzbass.net/ecology/
29	Создание, распечатка и рассылка буклетов, отражающих результаты проекта	После оформления итоговой версии ЭСК, были созданы буклеты, отражающие результаты проекта. Они были разосланы среди должностных лиц, специалистов по охране окружающей среды и природных ресурсов, просвещения и здравоохранения различных уровней. <i>(См. Приложение 1)</i>

КОММЕНТАРИИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ДИЗАЙН, НАПОЛНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЕРВЕРА КУЗБАССА

В первом квартале проекта, была поставлена задача по программированию и созданию дизайна для Экологического Сервера Кузбасса (ЭСК), основная работа была выполнена за 2 месяца. В дальнейшем по предложениям и просьбам посетителей велась постоянная доработка, в сторону упрощения пользования и более удобного представления информации на сервере. На текущий момент сервер уже оформлен в своем итоговом варианте и постоянно принимает посетителей.

Паралельно с созданием сервера на протяжении всего проекта, по мере выполнения запланированных в проекте мероприятий происходило постоянное его информационное наполнение, благодаря мероприятиям по сбору информации по:

- природоохранным организациям г. Новокузнецка
- Не ППиТ проектам (г. Новокузнецк)
- ПППиТ «Контроль за многофакторными источниками загрязнения» (г. Новокузнецк)
- проектам и организациям г. Междуреченска
- проектам и организациям г. Кемерово
- проектам и организациям других г.г. Кемеровской обл.

Как уже говорилось ранее, вся информация была собрана в полном объеме и даже более того объема, который изначально предусматривал проект. После соответствующей

обработки и перевода всей полученной информации (текстовой и графической) в электронный вид велось постепенное наращивание информационного объема сервера. Для организаций в разделе ОРГАНИЗАЦИИ создавались WWW-страницы, отражающие историю, деятельность, достижения, информацию о руководстве и персонале, проектам и контактной информации, для проектов (в разделе ПРОЕКТЫ) создавались страницы отражающие полное содержание проекта с набором фотографий и других графических элементов. Помимо уже описанных 2-х разделов, на сервера постепенно вводились в эксплуатацию такие разделы как:

КОНТАКТЫ

В этом разделе была создана и постоянно пополняется база данных по организациям Кемеровской обл., участвующим в решении экологических проблем. Этот раздел не был изначально запланирован в структуре сервера, до подачи заявки, но ввиду его необходимости, было принято решение по его созданию и поддержке. На текущий момент в нем размещена контактная информация всех изъявивших желание природоохранных организаций, всего тридцать. Записи содержат адресную (почтовый адрес), контактную (телефон, факс, e-mail, WWW) информацию.

При получении заявки на размещение информации в этот раздел от организации, проводится соответствующая проверка и если деятельность организации отвечает главному требованию – “деятельность в природоохранной области”, то производится ее размещение. С момента окончания проекта уже была размещена информация по 2м организациям. В дальнейшем предполагается вести постоянную поддержку этого раздела.

ЭКО-АТЛАС

Используя печатный вариант Экологического атласа Кемеровской области, было проведено сканирование на профессиональном сканере, и дальнейшее ретуширование полученного изображения. Далее была произведена адаптация изображения для Интернета и размещение его в раздел «ЭКО-атлас». В дальнейшем предполагается по мере выхода новых эко-карт, размещать их на сервер.

ГОСТЕВАЯ КНИГА

Этот раздел был создан в целях, обеспечить максимально простой и понятный способ общения посетителей сервера с администрацией, а так же с той целью, чтобы посетители имели возможность оставлять свои пожелания, предложения и рекламу в области экологии на страницах сервера. Т.е. раздел выполняет две функции, во-первых, он служит порталом для наиболее упрощенного общения с администрацией (даже человек, который не имеет e-mail адреса может послать письмо), а во-вторых, рекламной площадкой практически для всех российских природоохранных организаций.

АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ САЙТА

Вторым по значимости, после информационного наполнения сервера, в плане работ проекта значилось создание англоязычной версии сайта. К этой стадии работы мы приступили уже после того, как имели полностью готовую русскоязычную версию сервера. Профессиональный переводчик, в общей сложности за один месяц перевел все материалы сервера на английский язык, это более 300.000 символов. За следующий месяц работ, была создана англоязычная интернет версия ЭСК, с полностью схожей структурой и размещенной информацией.

Созданная англоязычная версии ЭСК, по нашему мнению будет содействовать развитию сотрудничества между природоохранными общественными организациями в России и США. Для воплощения в жизнь этой задачи были поданы соответствующие

заявки в англоязычные системы мирового поиска ресурсов Интернета, с целью предоставить организациям всего мира наиболее легко и просто находить информацию о подобных организациях в нашей области. Результаты возможных будущих контактов, мы надеемся, послужат действенным партнерством на основе российского и американского опыта, знаний и результатов.


ВЫВОДЫ:

Работу по созданию и информационному наполнению сервера можно считать успешной, это подтверждают и приведенные выше факты. На текущий момент нашей основной целью является популяризация сервера посредством рекламы через печатные, сетевые средства массовой информации и рекламные службы. Для этого были созданы буклеты и разосланы среди должностных лиц, специалистов по охране окружающей среды и природных ресурсов, просвещения и здравоохранения различных уровней. Для освещения проделанной работы среди широкого круга читателей и более подробного их ознакомления с целями и результатами работы, в ЭКО-бюллетене (№1 за 2000, №6 за 2000г), в электронной рассылке ИнЭКА-Инфо были размещены информационные материалы об Экологическом Сервере Кузбасса, рассказывающие о целях, задачах, достигнутых и предполагаемых результатах проекта. Готовиться к публикации материал о результатах проекта и о планах дальнейшего развития Экологического Сервера Кузбасса.

С целью обеспечить долговременную рекламу (а не разовую, за счет привлечения дополнительных средств) было принято решение сделать ЭСК участником службы обмена баннерами www.ir.ru. На каждой странице сервера в самом низу размещен специальный программный код, благодаря которому мы производим обмен баннерами с другими серверами. Во время обмена мы показываем, чужой баннер, и одновременно наш баннер показывается на других серверах Интернета. Благодаря этому, ЭСК постоянно рекламируется в русско- и англо- язычной части Интернета. Помимо этого была осуществлена регистрация сервера в мировых и российских поисковых системах, каталогах и рубриках, что значительно облегчит процесс поиска сервера заинтересованными лицами.

СТАТИСТИКА ПОСЕЩЕНИЙ

Хотелось бы особенно остановиться на статистике посещения страниц сайта, т.к. это является количественным показателем просмотра страниц сервера. Мы взяли статистику с сервера www.ir.ru за период с 31.08.2000 по 31.09.2000, она выражена в нижеприведенном графике:

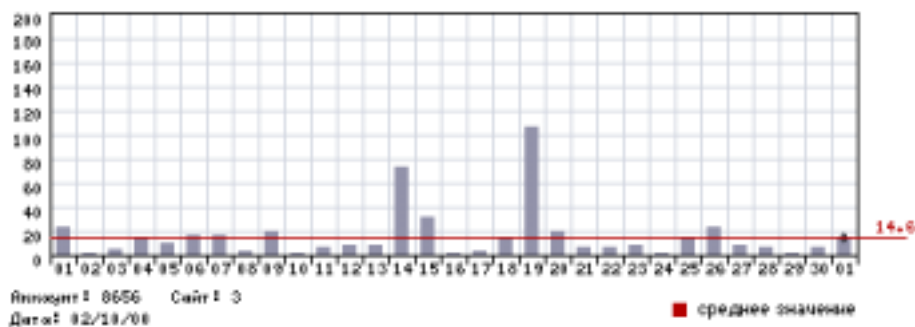

На графике вертикальные столбцы отражают кол-во просмотров по дням месяца, среднее кол-во посещения страниц в день составляет – 14.6 (Красная линия). По графику видно, что бывают дни, когда кол-во посещения страниц достигает более 80 посещения в день.

Кол-во посещений за месяц - 509
Максимальное кол-во посещений в день - 109

На первый период работы сервера результаты, оказались практически такими на которые мы рассчитывали. В дальнейшем же мы рассчитываем, что кол-во посещений возрастет до 80-120 ежедневно. На это есть все основания, на текущий момент сайт зарегистрировало только 50% поисковых машин, каталогов и рубрикаторов, на которые были поданы заявки на размещение информации. Это вызвано тем, что у каждого рекламного сервера есть очередь выполнения заказов, т.е. заявки на размещение ставятся в список ожидания и только после соответствующей проверки, сайт заносится в каталог. В среднем на это может уходить до 2-х месяцев, а иногда и больше.

РЕЗЮМЕ:

Исходя из приведенных выше данных, можно сделать вывод, что сервер уже имеет свою аудиторию посетителей, выраженную в конкретных цифрах, 14 просмотров в день для сервера на период его становления в сети это вполне хорошие результаты. В будущем за счет привлечения новых посетителей через поисковые системы, рубрикаторы, доски объявления и рекламу кол-во просмотров предполагается увеличить до 80 в день, а этот показатель будет очень хорошим. Такой раздел как ГОСТЕВАЯ КНИГА, уже сейчас является показателем необходимости подобных серверов по всей России. Вот только две записи из книги, с ними вы можете ознакомиться так же на сайте в Интернете:

Имя: CasnНИРХ

Город: Астрахань

URL: <http://caspnirh.astranet.ru>

Комментарии: Очень приятно оформлена ваша страничка, спасибо. Хотелось бы увидеть на ней

побольше информации, связанной с работой экологических клубов вашего края.

Tuesday, September 12, 2000 at 17:01:05 (MSD)

Имя: Тийду Александр

E-mail: Tiydu@mail.ru

Город: Красноярск

URL: В разработке

Комментарии: Теплый привет с Краевой станции юных натуралистов города Красноярска. Вообще, у

вас тут очень здорово всё сделано. В ближайшем будущем мы тоже открываем свой сайт и хотелось бы

наладить с вами контакт (ну для начала обменяться ссылками).

Счастливи!!!

Успехов Вам!!!

ТРУДНОСТИ ПРОЕКТА

- Возникали проблемы связанные, с тем, что руководители нескольких организаций не оказывали активной помощи при сборе информации по своим организациям. В лучшем случае они выделяли одного работника, с которым потом мы вели работу. Он же не мог предоставить столь развернутой информации по организации, сколько мог бы предоставить ее руководитель.
- При сборе информации по ПППиТ «Контроль за многофакторными источниками загрязнения», по некоторым проектам не сохранилось полной информации у новокузнецких исполнителей проекта, а так же некоторые исполнители, перестали работать в организациях-исполнителях.
- Большинство организаций совершенно не имели фотографий по своей деятельности и фотографий сотрудников, вследствие чего фотоработы для оформления страниц организаций проводились на протяжении 1,5 месяца, вместо 15 запланированных дней.
- В ходе реализации не запланированного в проекте мероприятия по созданию клиентской базы данных, с контактной информацией природоохранных организаций Кемеровской области, мы столкнулись с проблемой устаревшей контактной и адресной информации.
- Из-за повышения курса доллара, с момента подписания соглашения с ISC, была потеряна договоренность с переводчиком, который был согласен перевести все материалы сервера на английский язык. Вследствие чего мы были вынуждены искать нового переводчика, который согласился бы выполнить 2х месячный план за сумму оговоренную в соглашении.
- В ходе рекламной компании ЭСК, при регистрации в поисковых системах возникла, предвиденная ранее проблема, связанная с задержкой в занесении в базу данных каталогов, рубрикаторов и т.д. Вплоть до текущего момента ЭСК не зарегистрировало еще большое кол-во поисковых машин, из-за большой их перегруженности.

УСПЕХИ ПРОЕКТА

- Проект " Распространение опыта и результатов природоохранных общественных организаций Кемеровской области в сети Интернет " представлен для широкой аудитории как в России, так и во всем мире, благодаря предоставлению информации на русском и английском языках.
- Впервые в России создан сервер, включающий в себя наиболее полную и корректную информацию по всем природоохранным организациям одного отдельно взятого региона – Кемеровской обл. С таким охватом как, информация об организациях, их проектах, деятельности, персонале, контактной и адресной информации, и многом другом. Отображение информации в Интернете, совместно с ее общедоступностью послужит благоприятным полем для более тесного сотрудничества (в выполнении проектов, решению природоохранных задач, привлечению инвестиций) организациям из нашего региона и из других регионов страны, а благодаря размещению информации на английском языке, также и из-за границы.
- Создана база данных КОНТАКТЫ, которая является на текущий момент наиболее полной по содержанию контактной и адресной информации о природоохранных организациях Кемеровской обл.
- Информация по Проекту ПППиТ «Контроль за многофакторными источниками загрязнения» (г. Новокузнецк) размещена в Интернете, на английском и русском

языках, что будет способствовать продвижению идей, наработанных решений этого проекта в других регионах страны.

КОММЕНТАРИИ:

Реализация проекта "Распространение опыта и результатов природоохранных общественных организаций Кемеровской области в сети Интернет " дает основание говорить о частичном снятии такой проблемы, как информационный обмен между природоохранными организациями Кемеровской области. Многие организации испытывали проблемы в представлении и распространении информации о себе и о своих проектах. У многих организаций области занятых в решении экологических проблем, часто возникали проблемы с получением информации по другим организациям, исчерпывающей информации по направлениям их деятельности, выполняемым и уже законченным проектам, планам работ, персонале, руководстве и контактной информации. Одним из самых реальных, мало затратных и наиболее действенных способов распространить эту информацию и привлечь внимание к организации, ее проектам и деятельности, заинтересованных людей по всему миру - размещение информации в сети Интернет. Основываясь именно на этом, был создан и в настоящее время поддерживается Экологический Сервер Кузбасса (ЭСК), который решает эти задачи.

Благодаря достигнутой договоренности между ИнЭКА и разработчиком сайта, в будущем, после завершения проекта, при получении заявки от природоохранной организации на размещение информации и/или изменение уже существующей информации будет производиться ее размещение/изменение на безвозмездной основе. Так же, помимо вышеизложенных мероприятий, предполагается вести постепенное наращивание и расширение структуры сервера, за счет введения новых разделов и размещения новой информации по природоохранной тематике. Тем самым, проект не ограничивается сроками официального проведения мероприятий, а будет и в дальнейшем поддерживать и выполнять возложенные на него задачи.
